
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**HOCHBAU**		
2	LPH 5 Ausführungsplanung	Mon 24.08.26	Fre 09.10.26
3	LPH 6 Erstellen der Leistungsverzeichnisse	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26
4	LPH 7 Vergabe	Mon 19.10.26	Fre 25.12.26
5	LPH 8 Bauüberwachung	Mon 01.02.27	Fre 05.05.28
6			
7	**HAUS 2**		
8	Baubeginn Haus 2	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
9	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
10	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau Sanitärobjekte)	Die 02.02.27	Die 02.02.27
11	Maurer (Putz- und Estricharbeiten)	Don 04.02.27	Fre 05.02.27
12	Fliesenleger (Fliesen legen und verfugen)	Mon 08.02.27	Die 09.02.27
13	Sanitär (Endmontage)	Mit 10.02.27	Mit 10.02.27
14	Malerarbeiten	Don 11.02.27	Fre 12.02.27
15	Elektroarbeiten	Mon 15.02.27	Die 16.02.27
16	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mit 17.02.27	Fre 19.02.27
17	Übergabe an den Nutzer	Mon 22.02.27	Mon 22.02.27
18			
19	**HAUS 3**		
20	Baubeginn Haus 3	Mon 22.02.27	Mon 22.02.27
21	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 23.02.27	Die 23.02.27
22	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Die 23.02.27	Die 23.02.27
23	Sanitär (Rohinstallation)	Mit 24.02.27	Mit 24.02.27
24	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Don 25.02.27	Fre 26.02.27
25	Fliesenarbeiten	Mon 01.03.27	Die 02.03.27
26	Sanitär (Endmontage)	Mit 03.03.27	Mit 03.03.27
27	Malerarbeiten	Don 04.03.27	Fre 05.03.27
28	Elektroarbeiten	Mon 08.03.27	Mon 08.03.27
29	Abnahme und Mängelbeseitigung	Die 09.03.27	Don 11.03.27
30	Übergabe an den Nutzer	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27
31			
32	**HAUS B**		
33	Baubeginn Haus B	Mon 15.03.27	Mon 15.03.27
34	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 16.03.27	Die 16.03.27
35	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Die 16.03.27	Die 16.03.27
36	Sanitär (Rohinstallation)	Mit 17.03.27	Mit 17.03.27
37	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Don 18.03.27	Fre 19.03.27
38	Trockenbauarbeiten	Mon 22.03.27	Mit 24.03.27
39	Fliesenarbeiten	Don 25.03.27	Fre 26.03.27
40	Sanitär (Endmontage)	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27
41	Malerarbeiten	Die 30.03.27	Mit 31.03.27
42	Elektroarbeiten	Don 01.04.27	Don 01.04.27
43	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mon 05.04.27	Mit 07.04.27
44	Übergabe an den Nutzer	Don 08.04.27	Don 08.04.27
45			
46	**HAUS C**		
47	Baubeginn Haus C	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27
48	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 13.04.27	Die 13.04.27
49	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Die 13.04.27	Die 13.04.27
50	Sanitär (Rohinstallation)	Mit 14.04.27	Mit 14.04.27
51	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Don 15.04.27	Fre 16.04.27
52	Trockenbauarbeiten	Mon 19.04.27	Mit 21.04.27
53	Fliesenarbeiten	Don 22.04.27	Fre 23.04.27
54	Sanitär (Endmontage)	Mon 26.04.27	Mon 26.04.27
55	Malerarbeiten	Die 27.04.27	Mit 28.04.27
56	Elektroarbeiten	Don 29.04.27	Don 29.04.27
57	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mon 03.05.27	Mit 05.05.27
58	Übergabe an den Nutzer	Don 06.05.27	Don 06.05.27
59			
60	**HAUS D**		
61	Baubeginn Haus D	Mon 17.05.27	Mon 17.05.27
62	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 18.05.27	Die 18.05.27
63	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Die 18.05.27	Die 18.05.27
64	Sanitär (Rohinstallation)	Mit 19.05.27	Mit 19.05.27
65	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Don 20.05.27	Fre 21.05.27
66	Trockenbauarbeiten	Mon 24.05.27	Mit 26.05.27
67	Fliesenarbeiten	Don 27.05.27	Fre 28.05.27
68	Sanitär (Endmontage)	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27
69	Malerarbeiten	Die 01.06.27	Mit 02.06.27
70	Elektroarbeiten	Don 03.06.27	Don 03.06.27
71	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mon 07.06.27	Mit 09.06.27
72	Übergabe an den Nutzer	Don 10.06.27	Don 10.06.27
73			
74	**HAUS 4**		
75	Baubeginn Haus 4	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27
76	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 22.06.27	Die 22.06.27
77	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 23.06.27	Mit 23.06.27
78	Sanitär (Rohinstallation)	Don 24.06.27	Don 24.06.27
79	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 25.06.27	Mon 28.06.27
80	Fliesenarbeiten	Die 29.06.27	Mit 30.06.27
81	Sanitär (Endmontage)	Don 01.07.27	Don 01.07.27
82	Malerarbeiten	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27
83	Elektroarbeiten	Die 06.07.27	Die 06.07.27
84	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mit 07.07.27	Fre 09.07.27
85	Übergabe an den Nutzer	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27
86			
87	**HAUS 5**		
88	Baubeginn Haus 5	Mon 16.08.27	Mon 16.08.27
89	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 17.08.27	Die 17.08.27
90	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 18.08.27	Mit 18.08.27
91	Sanitär (Rohinstallation)	Don 19.08.27	Don 19.08.27
92	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 20.08.27	Mon 23.08.27
93	Trockenbauarbeiten	Die 24.08.27	Don 26.08.27
94	Fliesenarbeiten	Fre 27.08.27	Mon 30.08.27
95	Sanitär (Endmontage)	Die 31.08.27	Die 31.08.27
96	Malerarbeiten	Mit 01.09.27	Don 02.09.27
97	Elektroarbeiten	Fre 03.09.27	Fre 03.09.27
98	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mon 06.09.27	Mon 06.09.27
99	Übergabe an den Nutzer	Die 07.09.27	Die 07.09.27
100			
101	**HAUS 6a**		
102	Baubeginn Haus 5	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27
103	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 14.09.27	Die 14.09.27
104	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27
105	Sanitär (Rohinstallation)	Don 16.09.27	Don 16.09.27
106	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 17.09.27	Mon 20.09.27
107	Trockenbauarbeiten	Die 21.09.27	Die 21.09.27
108	Fliesenarbeiten	Mit 22.09.27	Don 23.09.27
109	Sanitär (Endmontage)	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27
110	Malerarbeiten	Mon 27.09.27	Die 28.09.27
111	Elektroarbeiten	Mit 29.09.27	Mit 29.09.27
112	Abnahme und Mängelbeseitigung	Don 30.09.27	Mon 04.10.27
113	Übergabe an den Nutzer	Die 05.10.27	Die 05.10.27
114			
115	**HAUS 6 (Gesa)**		
116	Baubeginn Haus 6	Mon 11.10.27	Mon 11.10.27
117	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 12.10.27	Die 12.10.27
118	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 13.10.27	Mit 13.10.27
119	Sanitär (Rohinstallation)	Don 14.10.27	Don 14.10.27
120	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 15.10.27	Mon 18.10.27
121	Trockenbauarbeiten	Die 19.10.27	Mon 25.10.27
122	Fliesenarbeiten	Die 26.10.27	Mit 27.10.27
123	Sanitär (Endmontage)	Don 28.10.27	Don 28.10.27
124	Malerarbeiten	Fre 29.10.27	Mon 01.11.27
125	Bodenbelagsarbeiten	Die 02.11.27	Mon 08.11.27
126	Elektroarbeiten	Die 09.11.27	Die 09.11.27
127	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mit 10.11.27	Fre 12.11.27
128	Übergabe an den Nutzer	Mon 15.11.27	Mon 15.11.27
129			
130	**HAUS 9**		
131	Baubeginn Haus 9	Mon 08.11.27	Mon 08.11.27
132	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 09.11.27	Die 09.11.27
133	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 10.11.27	Mit 10.11.27
134	Sanitär (Rohinstallation)	Don 11.11.27	Don 11.11.27
135	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 12.11.27	Mon 15.11.27
136	Trockenbauarbeiten	Die 16.11.27	Die 16.11.27
137	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mit 17.11.27	Fre 19.11.27
138	Übergabe an den Nutzer	Mon 22.11.27	Mon 22.11.27
139			
140	**HAUS 1 (Mensa)**		
141	Baubeginn Haus 1	Mon 29.11.27	Mon 29.11.27
142	Elektroarbeiten (Abklemmen der Leitungen)	Die 30.11.27	Die 30.11.27
143	Sanitär (Leitungen entleeren und Rückbau der Sanitärobjekte)	Mit 01.12.27	Don 02.12.27
144	Sanitär (Rohinstallation)	Fre 03.12.27	Don 16.12.27



Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
145	Putzarbeiten und Estricharbeiten	Fre 17.12.27	Don 23.12.27
146	Trockenbauarbeiten	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28
147	Fliesenarbeiten	Mon 10.01.28	Mon 17.01.28
148	Sanitär (Endmontage)	Die 18.01.28	Mit 26.01.28
149	Metallbauarbeiten	Mon 31.01.28	Mit 09.02.28
150	Malerarbeiten	Don 10.02.28	Don 17.02.28
151	Elektroarbeiten	Fre 18.02.28	Die 22.02.28
152	Abnahme und Mängelbeseitigung	Mit 23.02.28	Die 29.02.28
153	Übergabe an den Nutzer	Mit 01.03.28	Mit 01.03.28

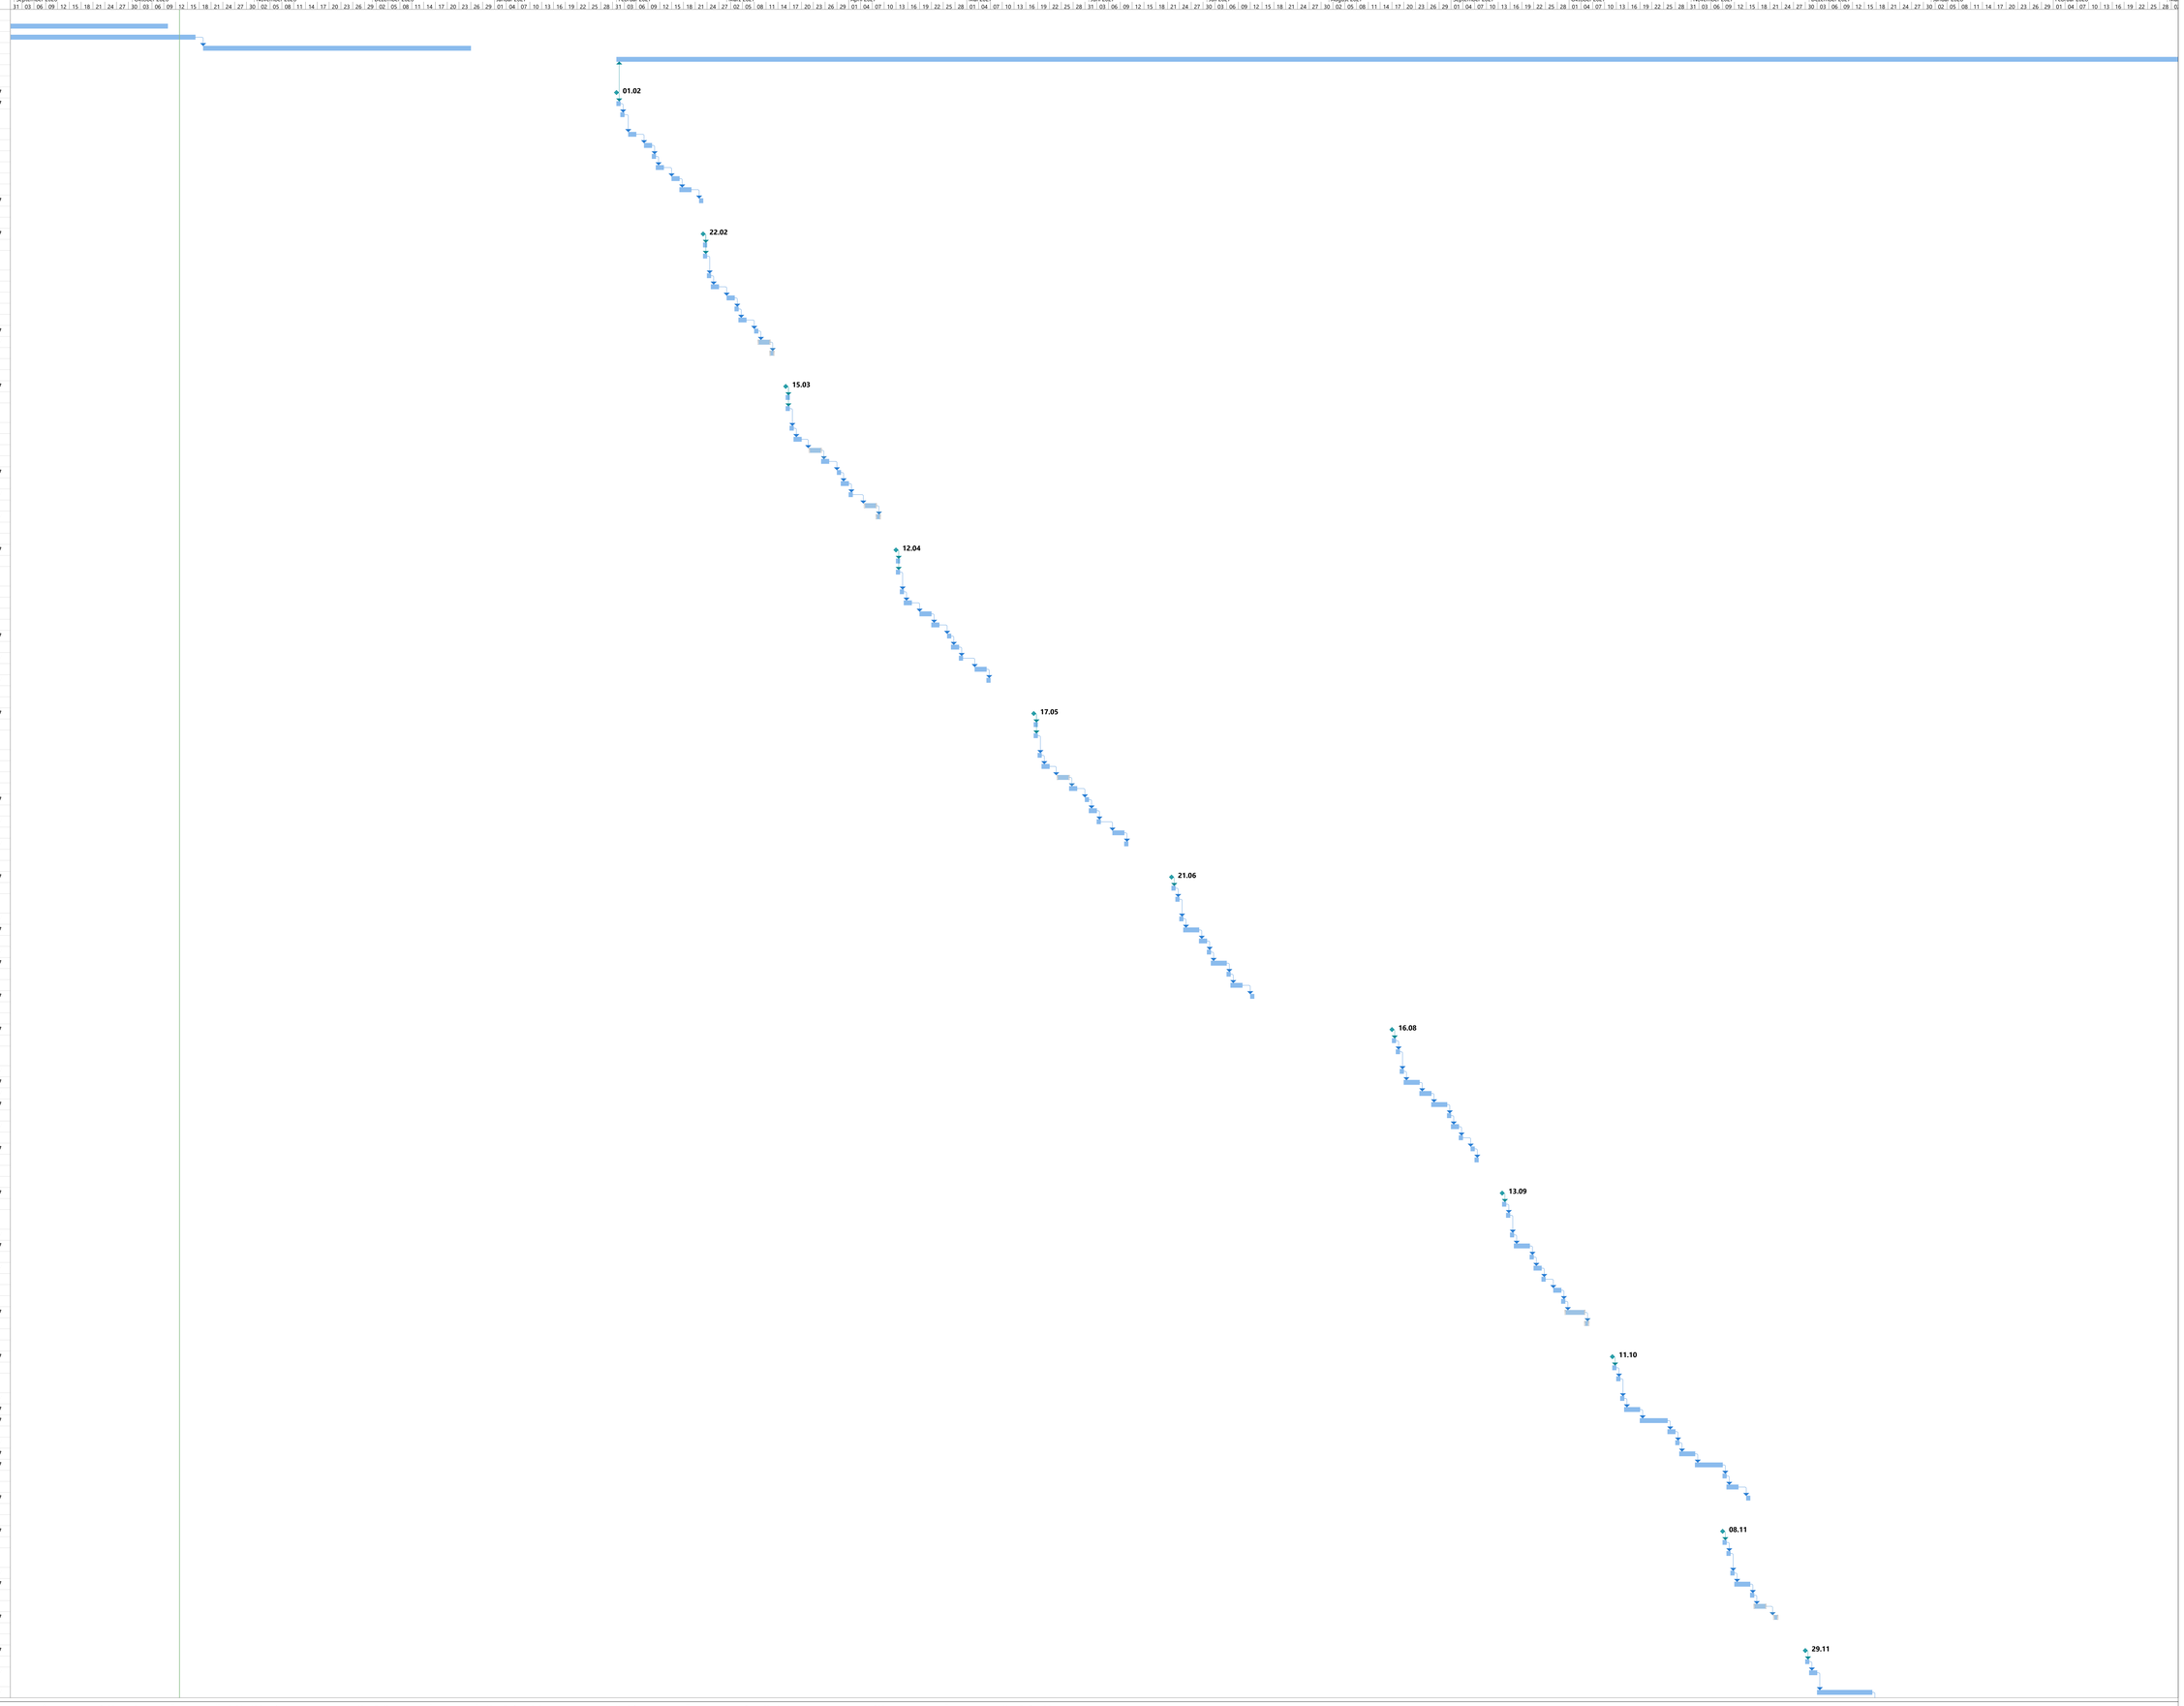
