
Terminplan

GS Bookholzberg -Anbau Mensa und Klassenräume- | Stand 10.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	**Rohbauleistung**				
2	Bauhauptarbeiten	107at	Mo, 12.10.26	Do, 11.03.27	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.1	Baustraße / Abbruch Bestand Erfordernis außen/ Sicherung / Erdarb. grob	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.2	Prov.- Abdichtung/Sicherung Abbruchflächen	3at	Fr, 23.10.26	Di, 27.10.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.3	Einmessen und auswinkeln durch Vermesser Anbau	2at	Do, 29.10.26	Fr, 30.10.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.4	Erdarbeiten fein	4at	Mo, 02.11.26	Do, 05.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.5	Schalung Fundamente mit Eisen	4at	Do, 05.11.26	Di, 10.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.6	Grundleitungen; Ausführung durch Sanitär	2at	Mi, 11.11.26	Do, 12.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.7	Blitzschutz	2at	Mi, 11.11.26	Do, 12.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.8	Fundamente und Sohle betonieren	2at	Fr, 13.11.26	Mo, 16.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.9	Ruhezeit Sohle	2at	Di, 17.11.26	Mi, 18.11.26	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.10	Mauerwerk, Stahlbeton und Treppe	60at	Do, 19.11.26	Fr, 12.02.27	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
2.11	Verfugung Verblender	10at	Fr, 26.02.27	Do, 11.03.27	H. Hesemann GmbH +49 (4732) 918100
3	Gerüstgestellung	78at	Fr, 27.11.26	Do, 18.03.27	
4	Zimmerarbeiten und Fassadenverkleidung	43at	Di, 05.01.27	Do, 04.03.27	
5	**Richtfest**	**1at**	**Fr, 19.02.27**	**Fr, 19.02.27**	
6	DDi u. DD 1. Lage ges. ausgewiesen	28at	Di, 19.01.27	Do, 25.02.27	
7	Klempnerarbeiten	10at	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27	
8	Abklebung unterhalb der TGA Leitungen	3at	Mo, 08.02.27	Mi, 10.02.27	
9	Haustechnik / Roh	38at	Mo, 15.02.27	Fr, 09.04.27	
9.1	Heizungsleitungen / Verteiler etc.	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27	
9.2	Fussbodenheizung + Dämm.	5at	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27	
9.3	Lüftung	20at	Mo, 22.02.27	Fr, 19.03.27	
9.4	Sanitär	25at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.03.27	
9.5	Elektro	25at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.03.27	
9.6	EDV	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	
10	Fenster Aufmaß und Montage	36at	Di, 05.01.27	Di, 23.02.27	
11	Weitere Abbrucharb. Bestand TRH etc.	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27	
12	Sonnenschutzarbeiten	33at	Di, 23.02.27	Mo, 12.04.27	
13	Metallzargen	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27	
14	Putzarbeiten EG / OG	6at	Mo, 22.03.27	Mi, 31.03.27	
15	Abklebung der Sohle	2at	Do, 01.04.27	Fr, 02.04.27	
16	Estricharbeiten	5at	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27	
17	Trocknung belegereif mit Zusatz	13at	Do, 01.04.27	Mo, 19.04.27	
18	**Ausbauarbeiten**				
19	Haustechnik / Ausbau	41at	Mo, 03.05.27	Mi, 30.06.27	
19.1	Heizung	10at	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27	
19.2	Lüftung	20at	Mo, 03.05.27	Di, 01.06.27	
19.3	Sanitär	10at	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27	
19.4	Elektro	10at	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27	
19.5	Beleuchtung und Schalter	15at	Do, 10.06.27	Mi, 30.06.27	
19.6	EDV	15at	Do, 10.06.27	Mi, 30.06.27	
20	Schlosserarbeiten Geländer	25at	Fr, 12.03.27	Mo, 19.04.27	
21	Schlosserarbeiten Aussentreppe	33at	Fr, 19.03.27	Fr, 07.05.27	
22	Wandfliesen	10at	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27	
23	Bodenfliesen	10at	Mo, 26.04.27	Mo, 10.05.27	
24	Trockenbau Roh. und Ausbau	20at	Mo, 26.04.27	Di, 25.05.27	
25	Innenfensterbank	3at	Mo, 19.04.27	Mi, 21.04.27	
26	Bodenbelag	20at	Mo, 07.06.27	Fr, 02.07.27	
27	Malerarbeiten	25at	Mi, 12.05.27	Mi, 16.06.27	
28	Innentüren /Blätter	3at	Mo, 05.07.27	Mi, 07.07.27	
29	Vorreinigung Küche etc.	2at	Do, 01.07.27	Fr, 02.07.27	
30	Montage Küche	5at	Mo, 05.07.27	Fr, 09.07.27	
31	Einrichtung durch Schule	8at	Do, 08.07.27	Mo, 19.07.27	
32	Endreinigung	2at	Di, 20.07.27	Mi, 21.07.27	
33	Aussenanlagen	45at	Mo, 05.04.27	Di, 08.06.27	

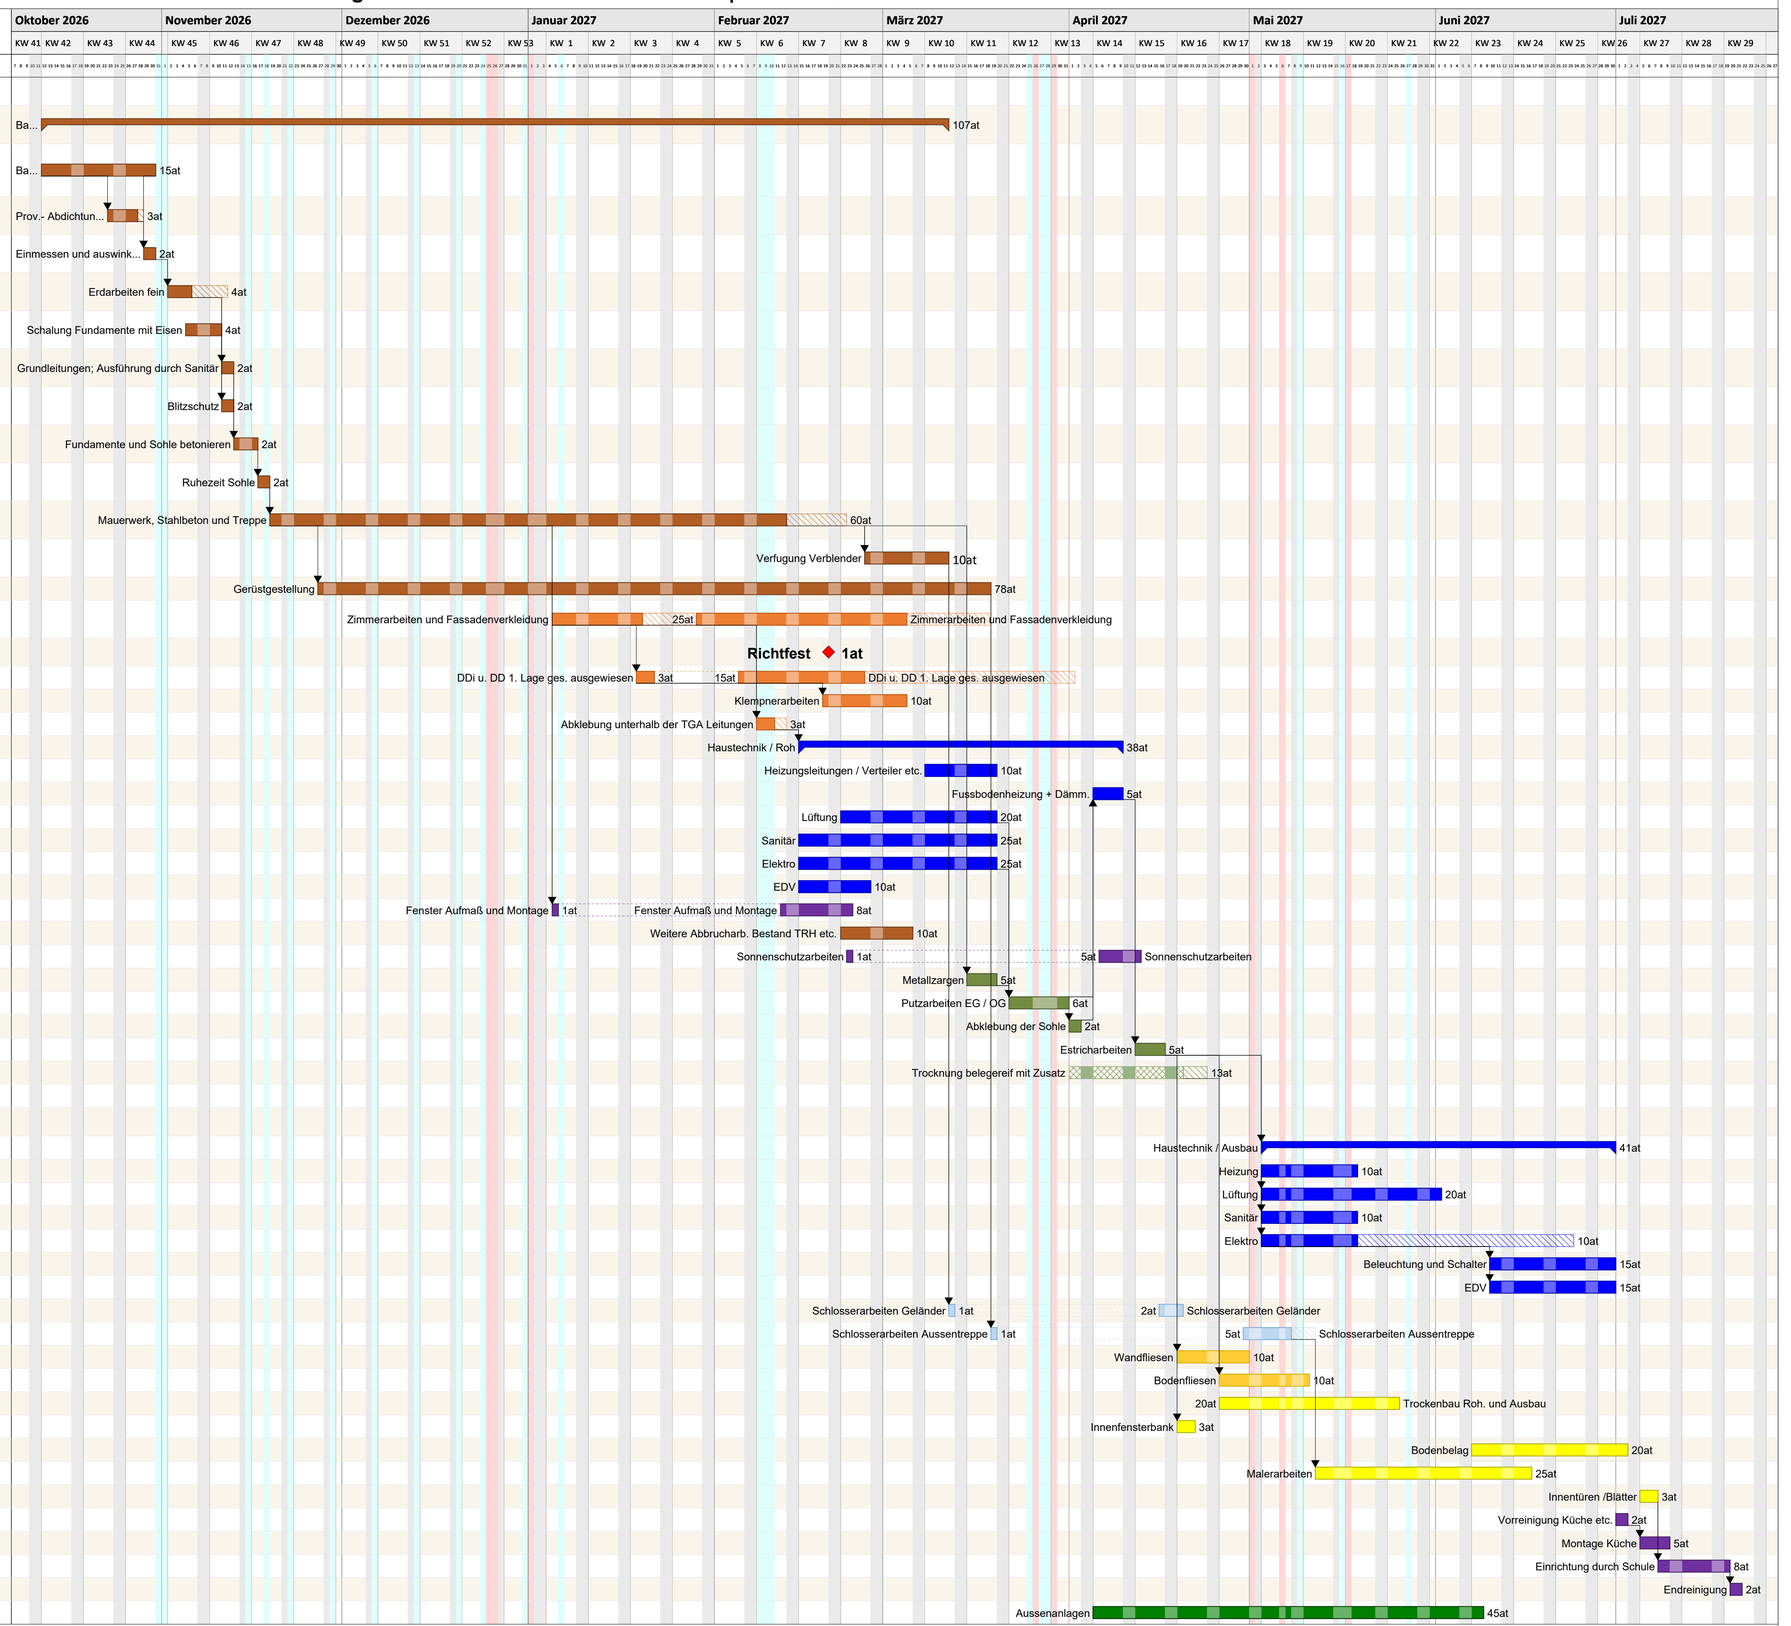

Projektzeitrahmen von Do, 01.10.26 bis Mi, 16.02.28
Kalender: Niedersachsen (eingebettet)
Druckdatum: 19.10.2026 08:31
Filter:
