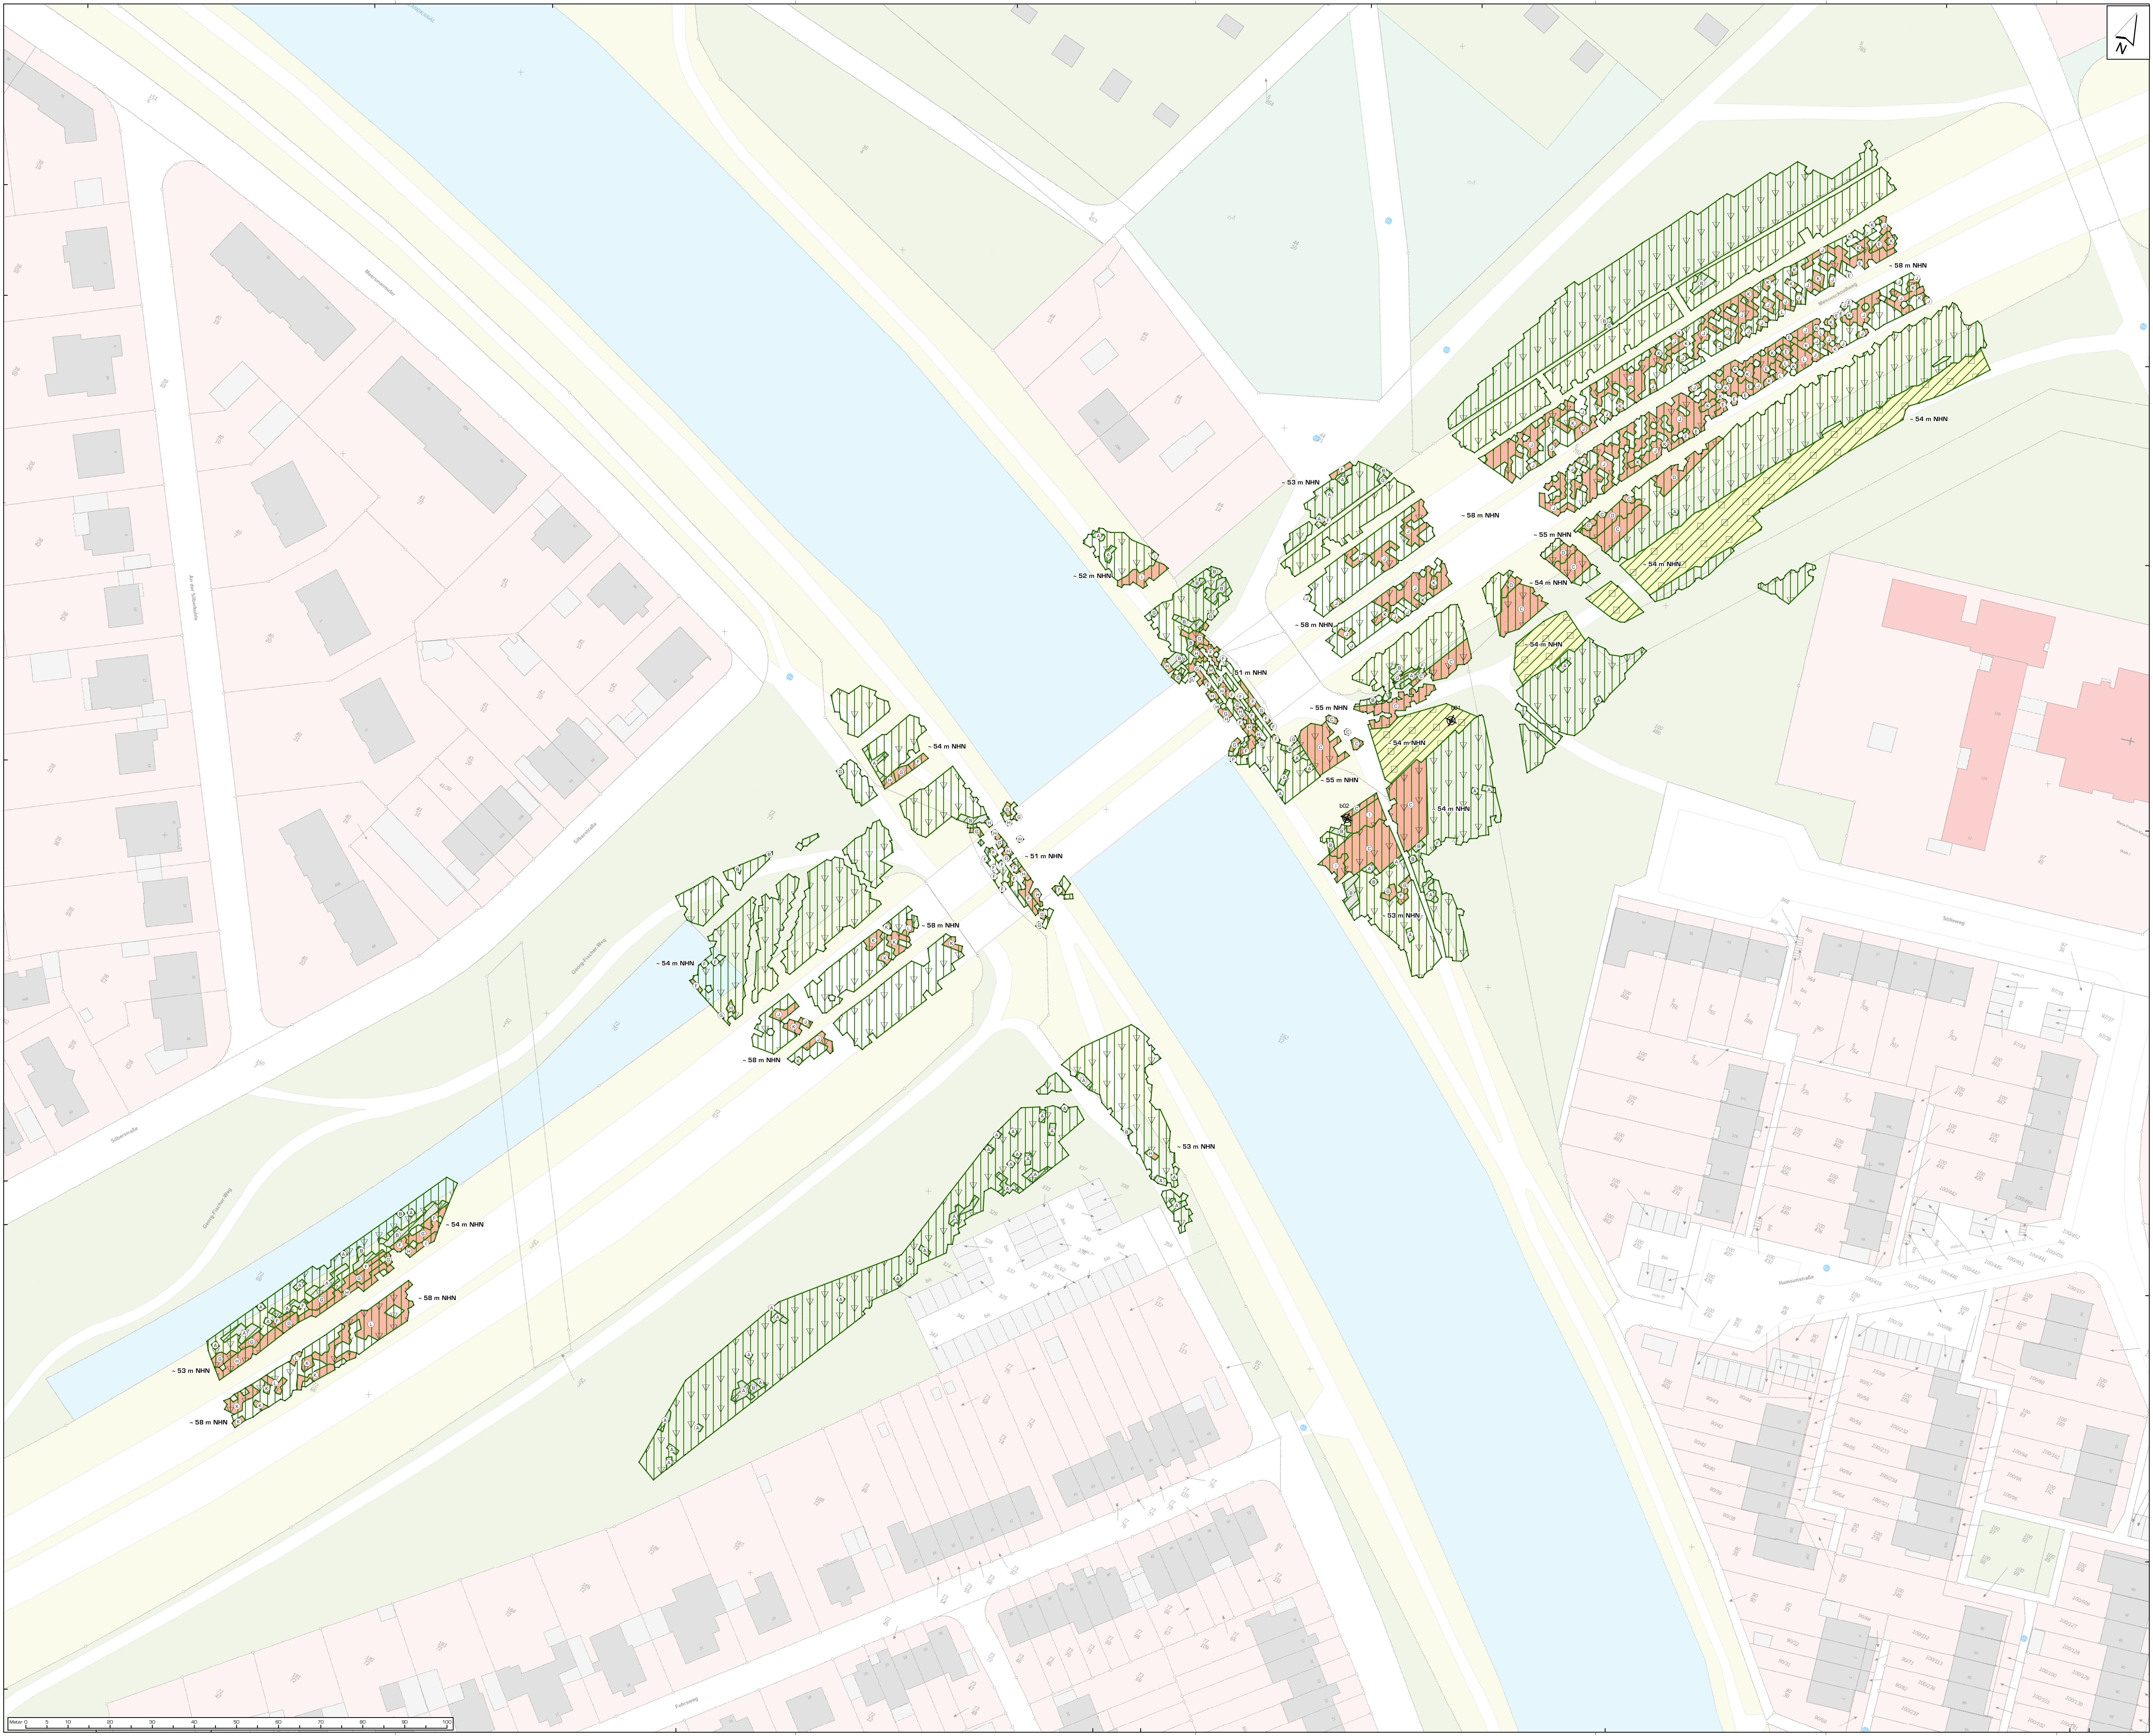

Legende

- ▥ Freigabefläche aus Bohrlochsondierung untersucht auf Abwurfmunition
  Fläche: 10.541,36 m²
- ▨ Freigabefläche aus lagenweisem Bodenabtrag und Bohrlochsondierung untersucht auf Abwurfmunition
  Fläche: 526,59 m²
  - Ⓐ Tiefe des Bodenabtrages: bis 1,0 m unter GOK
    Fläche: 311,36 m²
  - Ⓑ Tiefe des Bodenabtrages: bis 2,0 m unter GOK
    Fläche: 215,23 m²
- 🟥 **Tiefenbegrenzte Freigabefläche** **- Keine Freigabe**
  aus Bohrlochsondierung
  untersucht auf Abwurfmunition
  Fläche: 3012,71 m²
  - Ⓒ Freigabetiefe: bis 10,0 m unter GOK
    Fläche: 673,85 m²
  - Ⓓ Freigabetiefe: bis 12,0 m unter GOK
    Fläche: 125,11 m²
  - Ⓔ Freigabetiefe: bis 14,0 m unter GOK
    Fläche: 49,82 m²
  - Ⓕ Freigabetiefe: ab 1,0 m unter GOK
    Fläche: 168,27 m²
  - Ⓖ Freigabetiefe: ab 2,0 m unter GOK
    Fläche: 201,10 m²
  - Ⓗ Freigabetiefe: ab 3,0 m unter GOK
    Fläche: 158,19 m²
  - Ⓘ Freigabetiefe: ab 4,0 m unter GOK
    Fläche:103,25 m²
  - Ⓙ Freigabetiefe: ab 6,0 m unter GOK
    Fläche:1.065,05 m²
  - Ⓚ Freigabetiefe: ab 7,0 m unter GOK
    Fläche: 269,57 m²
  - Ⓛ Freigabetiefe: ab 8,0 m unter GOK
    Fläche: 198,49 m²
- 🟨 **Tiefenbegrenzte Freigabefläche** **- Keine Freigabe**
  aus lagenweisem Bodenabtrag mit Sohlensondierung
  untersucht auf Abwurfmunition
  Tiefe des Bodenabtrages: bis 2,5 m unter GOK
  Freigabetiefe: bis 4,0 m unter GOK
  Fläche: 1.181,25 m²

Gesamtfläche: 15.261,90 m²

⌖ Kampfmittelfund

Index	Datum	Änderung	Gez.
e			
d			
c			
b			
a			

Plangrundlage (nachrichtlich dargestellt):

Kartografische Grundlage:
© Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN, 2022) Stand: 17.12.2025
Geodätischer Bezug: ETRS89 mit UTM Zone 32N (LS 489)
Höhenbezugssystem: DHHN2016 NHN

Verantwortliche Person nach §19 SprengG:
F. Georgi

EGGERS
Kampfmittelbergung GmbH
Verwaltung
Harksheider Str.110, 22889 Tangstedt
Postfach 72 51, 22831 Norderstedt

Übersichtskarte ohne Maßstab

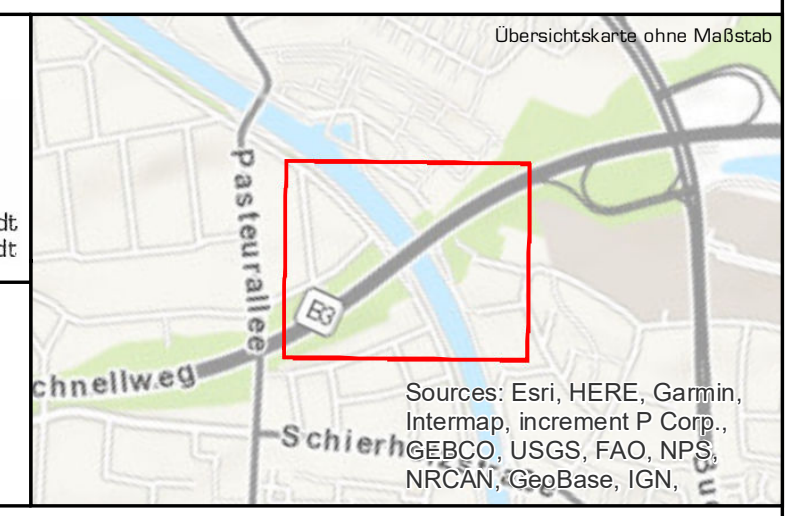

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,

EGGERS
KAMPFMITTELBERGUNG

Eggers Kampfmittelbergung GmbH
Postfach 7251, 22831 Norderstedt
Tel.: +49 (0) 4109 27 99 184
Fax: +49 (0) 4109 27 99 70
Mail: kampfmittel@eggers-gruppe.de

Auftraggeber	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Regionaler Geschäftsbereich Hannover Dorfstraße 17-19 30519 Hannover	Druckdatum 17.12.2025	Gezeichnet J. Furchert, VT
		Projekt-Nr. 24-195	Index
Projekt	Mittellandkanalbrücke Messeschnellweg 30655 Hannover-Buchholz	Bauantragsnummer KBD RS-2024-00982; RS-2025-01171	
		Dateiname 24-195_Freigabe_1.pdf	
Planname	**Freigabe_1**	Maßstab 1:500	Format A0
